

# Rapport Vochtmetingen (Constructiehout Buiten / Beschut)

Datum rapport: 20/10/2026


Referentiewaarden volgens NBN EN 1995-1-1 Klimaatklasse 2.

## 1. Conclusies & Actuele Status

Status gebaseerd op de laatst geregistreerde meting per punt:

- **Punt 8 (Meetpunt 8): 25,0% - Nat / Kritiek (> 20%)**
- **Punt 13 (Opening door OSB): 22,9% - Nat / Kritiek (> 20%)**
- **Punt 14 (Opening door OSB): 20,2% - Nat / Kritiek (> 20%)**
- Punt 1 (Meetpunt 1): 12,3% - Droog ( 18%)
- Punt 2 (Meetpunt 2): 12,2% - Droog ( 18%)
- Punt 3 (Meetpunt 3): 15,5% - Droog ( 18%)
- Punt 4 (Meetpunt 4): 11,7% - Droog ( 18%)
- Punt 5 (Meetpunt 5): 14,4% - Droog ( 18%)
- Punt 6 (Meetpunt 6): 13,1% - Droog ( 18%)
- Punt 7 (Meetpunt 7): 14,5% - Droog ( 18%)
- Punt 9 (Meetpunt 9): 14,5% - Droog ( 18%)
- Punt 10 (Meetpunt 10): 14,9% - Droog ( 18%)
- Punt 11 (Opening door OSB): 14,7% - Droog ( 18%)
- Punt 12 (Opening door OSB): 16,8% - Droog ( 18%)
- Punt 15 (Opening door OSB): 14,2% - Droog ( 18%)
- Punt 16 (Opening door OSB): 14,9% - Droog ( 18%)
- Punt 17 (Opening door OSB): 15,4% - Droog ( 18%)
- Punt 18 (Opening door OSB): 14,5% - Droog ( 18%)
- Punt 19 (Meetpunt 19): 14,5% - Droog ( 18%)
- Punt 20 (Meetpunt 20): 13,7% - Droog ( 18%)

## 2. Grondplan & Meetlocaties

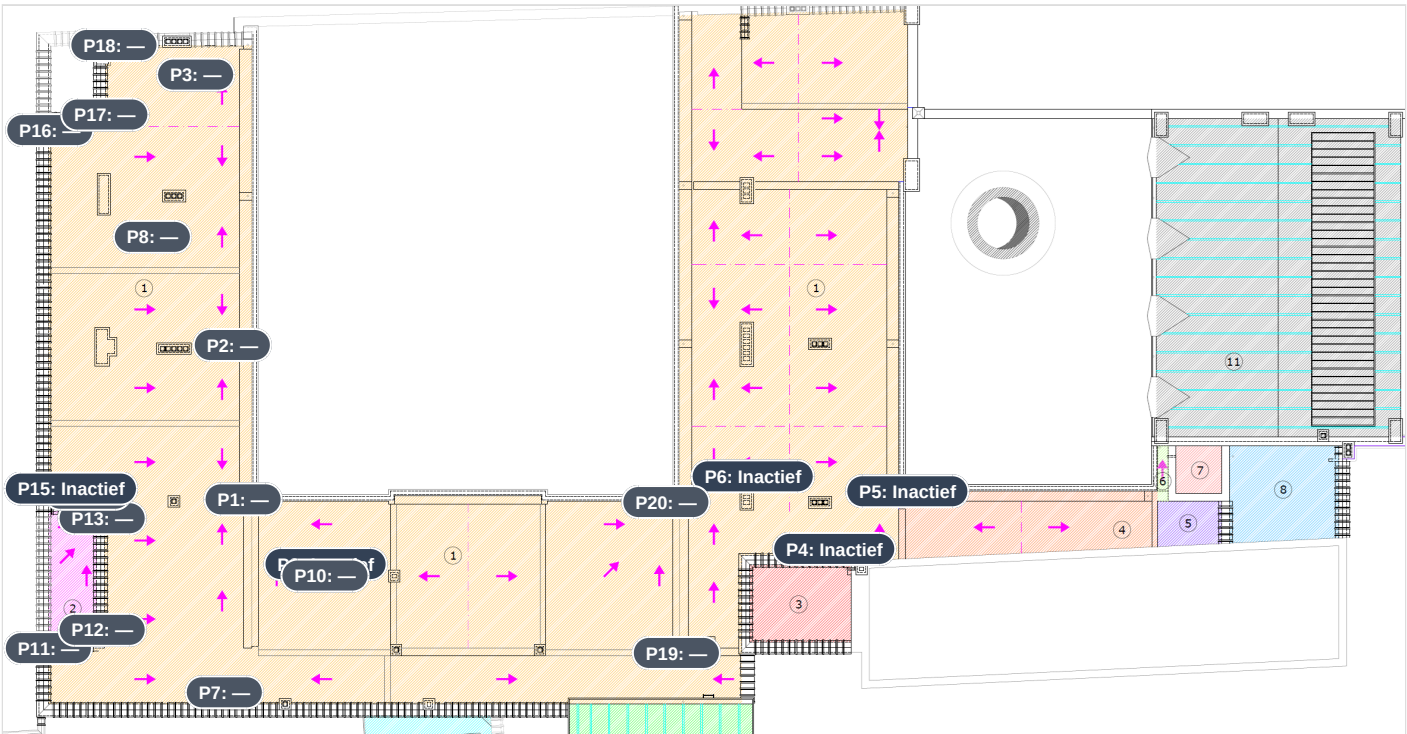

## 3. Cijfers & Trend (Laatste 30 dagen)

| Punt | Benaming | Min (%) | Max (%) | Gemiddelde (%) | Korte Trend (7d) |
|------|----------|---------|---------|----------------|------------------|
|------|----------|---------|---------|----------------|------------------|

|    |                  |      |      |      |   |
|----|------------------|------|------|------|---|
| 1  | Meetpunt 1       | 9,0  | 14,5 | 12,2 | - |
| 2  | Meetpunt 2       | 8,3  | 19,3 | 13,5 | - |
| 3  | Meetpunt 3       | 11,8 | 15,5 | 14,0 | - |
| 4  | Meetpunt 4       | 11,7 | 14,5 | 12,8 | - |
| 5  | Meetpunt 5       | 11,6 | 14,5 | 13,8 | - |
| 6  | Meetpunt 6       | 11,3 | 13,1 | 12,4 | - |
| 7  | Meetpunt 7       | 11,5 | 14,5 | 12,4 | - |
| 8  | Meetpunt 8       | 14,6 | 25,2 | 19,9 | - |
| 9  | Meetpunt 9       | 14,5 | 14,5 | 14,5 | - |
| 10 | Meetpunt 10      | 9,2  | 23,0 | 15,3 | - |
| 11 | Opening door OSB | 14,4 | 14,9 | 14,7 | - |
| 12 | Opening door OSB | 14,5 | 16,8 | 15,3 | - |
| 13 | Opening door OSB | 11,7 | 22,9 | 16,4 | - |
| 14 | Opening door OSB | 14,1 | 20,2 | 17,1 | - |
| 15 | Opening door OSB | 14,2 | 16,7 | 15,4 | - |
| 16 | Opening door OSB | 14,3 | 14,9 | 14,6 | - |
| 17 | Opening door OSB | 14,2 | 15,4 | 14,9 | - |
| 18 | Opening door OSB | 11,6 | 14,5 | 12,6 | - |
| 19 | Meetpunt 19      | 14,5 | 14,5 | 14,5 | - |
| 20 | Meetpunt 20      | 13,7 | 13,7 | 13,7 | - |

## 4. Grafische Evolutie

Verloop van de metingen gedurende de laatste 30 dagen.

